

10.000 Happy Birthdays by Rotary Global Grant Prosjekt, Malawi





Bakgrunn og historie for 10 000 HAPPYBIRTHDAYS- PROGRAMMET

•2014-16

1, - Program initiert av Lærdal Global Health i Malawi og Zambia i samarbeid med ICM og AMAMI og MAZ som implementerings partnere. Rotaryklubber ble med for å samle inn penger.

•2018- 2021

2, - District Global Grants for 10KHB by Rotary in Malawi and Zambia

•2022-2025

3, - Third phase of 10KHB by Rotary in Malawi as a Global Grant

10.000 Happy Birthdays by Rotary prosjektet



10 000 fokuser på Happy Birthday-prosjektet på to ulike opplæringsprogrammer for jordmødre:

- Gjenoppliving av nyfødte og håndtering av normal fødsel.



Jordmor lærere og jordmødre har allerede fått opplæring i gjenoppliving av nyfødte og behandling av blødning hos mødre i forrige Happy Birthday-prosjekt, men trenger ny opplæring i normal fødsel.

Prosjekt komiteen fra Hafrsfjord og Stavanger Rotary Klubb

10.000 Happy Birthdays by Rotary

Hafrsfjord Rotary Klubb



- ❖ Kjetil Galta – Prosjekt Leder
- ❖ Reidulf Klovning til April 2024- Prosjekt komite
- ❖ Karluf Skogen fra Mai 2024 - Prosjekt komite
- ❖ Christin Landmark - Prosjekt Support

Stavanger Rotary Klubb

- ❖ Beathe-Jeanette Lunde - Prosjekt komite
- ❖ Ove Sembsmoen – Prosjekt komite
- ❖ Astrid Frøseth – Prosjekt Support

Stavanger Rotary Klubb/ Laerdal Global Health

- ❖ Anna af Ugglas – Prosjekt Support

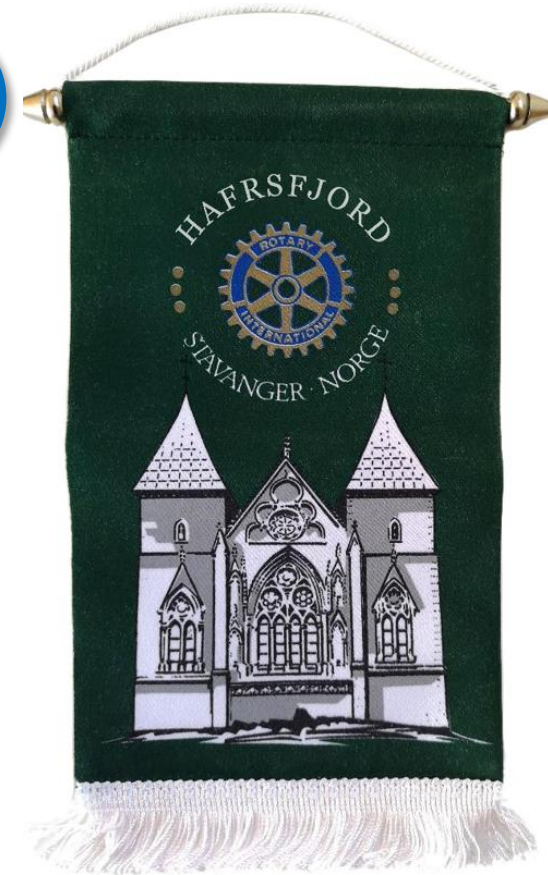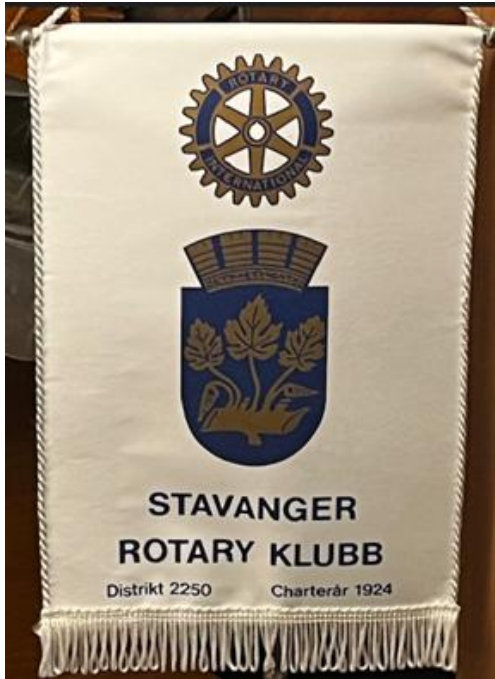

Mål for besøket



- **1.** Etablere en landsarbeidsgruppe for en tredje fase av 10.000 Happy Birthdays-prosjektet i Malawi sammen med prosjektgruppen i Norge
- **2.** Møte og samhandle med partnere for prosjektet
- **3.** Styrke støtten og arbeidsforholdet mellom AMAMI, UNFPA og Helsedepartementet
- **4.** Gjennomføre feltbesøk til noen av implementerings stedene, fødeavdelinger og jordmorskoler

Teamet fra Rotary, AMAMI og Laerdal Global Health


- Stella Kasirye– President Bwaila Rotary Club
- Hafez Jamal – President Elect and project lead, Bwaila Rotary Club (not present)
- Joseph Chavula, Bwaila Rotary Club (not present)
- Innocent Mofolo, Bwaila Rotary Club
- Keith Lipato– President AMAMI
- Mathias Chaduluka – Technical Advisor AMAMI
- Dan Kawaye – Vice President AMAMI
- Grace Yotamu – Vice Secretary AMAMI
- Christina Mchoma – Maternal and Newborn health programme officer at Ministry of Health, Department of Reproductive Health, attending the meetings and visits
- Kjetil Galta – project lead Hafersfjord Rotary Club, Stavanger
- Astrid Laerdal Frøseth – project support, Stavanger Rotary Club
- Anna af Ugglas, project member, Laerdal Global Health



Roller og ansvar i prosjektet


- ✓ Rotary MalawiBwaila Rotary Club Lilongwe: Vertsklubb som forvalter og utbetaler midler
- ✓ Rotary Norge Distrikt 2250: Internasjonal partner som samler inn midler
- ✓ Laerdal Global Health: Samarbeidspartner
- ✓ AMAMI: Implementeringspartner
- ✓ Malawi MoH: Støtte og godkjenning
- ✓ Norges ambassade: Rådgivning og støtte
- ✓ UNFPA (FNs befolknings Fond): Rådgivning og støtte
- ✓ ICM: Samarbeidspartner, kontakt med AMAMI og ekstern evaluering

Samarbeids partnere



Oppnådde mål i løpet av besøket

- Møtte teamet i Malawi ansikt til ansikt og etablerte en god samarbeidsånd og et godt forhold å bygge videre på.
 - Oppnådde rådgivning og støtte til prosjektet etter møte med:
 - UNFPA
 - Den norske ambassaden
 - Malawi helseministerium
 - Under besøk til skoler/universiteter og sykehus så vi at det er et stort behov for støtte og midler gjennom dette prosjektet

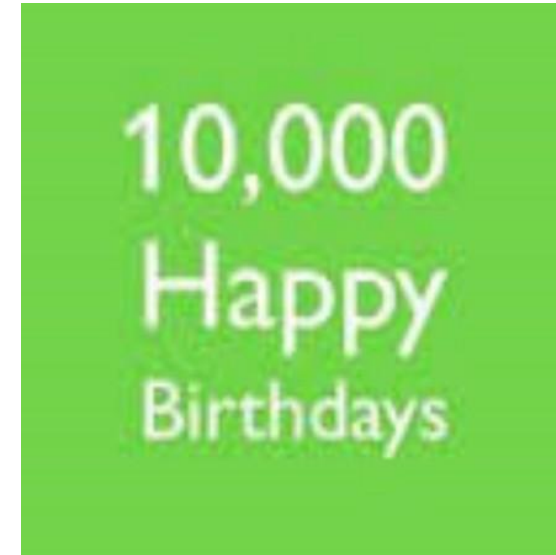

MOU ble utarbeidet og brukt som styrings verktøy

Memorandum of Understanding



10,000 HAPPY BIRTHDAYS – MALAWI PROJECT

1. SUBJECT

Global Grant No 2348182 in Lilongwe, Malawi for a Maternal and Neonatal Training project sponsored by the Rotary District 2250 in Norway and hosted by the Rotary Club of Bwaila – Lilongwe in District 9210, Lilongwe, Malawi.

2. PURPOSE

This Memorandum of Understanding defines the roles and responsibilities of all the participating organisations who will be involved in delivering a successful project by training health workers in Lilongwe and Mzimba districts to save the lives of mothers and children on the day of birth in order to reduce maternal and child mortality and morbidity. Cooperating organisations must comply with all reporting and auditing activities required by the Rotary Foundation and provide receipts and proof of purchase as required. This document serves to establish a framework of cooperation and agreement between the parties mentioned below as it pertains to the implementation of the project financed by a Rotary Foundation Global Grant.

3. PRIMARY CONTACTS

Name	Address	Phone	Email
Stella Kasirye Rotary Club of Bwaila - Lilongwe	P.O. Box 2440, Lilongwe		bwaila.projects@gmail.com
Kjetil Galta Hafrsfjord Rotary Club Rotary District 2250, Norway	Vestvollveien 4A, 4017 Stavanger, Norway	+47 99205611	kjetil.galta@aeronorway.no
International Confederation of Midwives (Attn: Martha Bokosi)	Koninginnegracht 60, The Hauge, 2514 AE, The Netherlands	+31 703 06 0520 +31 6 57215141	s.pairman@internationalmidwives.org
Malawi Association of Midwives (Attn: Keith Lipato)	P.O Box 31825 Lilongwe	+265888877066	keithlipato@yahoo.ie
Laerdal Global Health (Attn: Ingrid Laerdal)	Tanke Svilands gate 30 4022 Stavanger, Norway	+47 51 51 17 00	ingrid.laerdal@laerdal.com

4. UNDERSTANDINGS

- All parties affirm that Global Grant No. 2348182 is initiated, controlled and managed by the Rotary clubs and/or districts involved in the project.
- The Rotary Club of Bwaila, Malawi and the Rotary District 2250, Norway affirm that the International Confederation of Midwives, the Association of Malawian Midwives and Laerdal Global Health are reputable and responsible and act within all governing laws of the project country.
- All parties acknowledge that Global Grant No 2348182, if approved, will be awarded to the Rotary Club of Bwaila, Malawi and Rotary District 2250 Norway and not the International Confederation of Midwives or the Association of Malawian Midwives or Laerdal Global Health.

- All project funds will be in the custody of the partner Rotarians and not managed by the International Confederation of Midwives or the Association of Malawian Midwives or Laerdal Global Health.
- A project budget will be agreed by all parties with clear budget allocations for activities that are the responsibility of individual partners.
- That the International Confederation of Midwives, the Association of Malawian Midwives and Laerdal Global Health must abide by the Rotary Foundation grant terms and conditions.
- The International Confederation of Midwives, the Association of Malawian Midwives and Laerdal Global Health and their involvement in this project may be subject to financial and operational review audit by the Rotary Foundation.

5. THE ROTARY CLUB OF BWAILA, MALAWI SHALL:

- Receive and disburse funds to implementing organisations, according to the agreed budget and processes for transfer of funds.
- Visit health facilities where the project is implemented on a regular basis.
- Submit a community assessment processed in cooperation with the Association of Malawian Midwives.
- Plan the activities of the project on a quarterly basis with representatives of the Midwives' Association involved in the project.
- Follow up, coordinate and oversee the project.
- Submit progress and financial reports to sponsoring district.
- Coordinate publicity with local media.

6. THE ROTARY DISTRICT OF 2250 SHALL:

- Follow progress of the project in Malawi.
- Collect reports for the duration of the project.
- Consider and contribute the feasibility to implement a similar project after this is completed in Malawi.

7. INTERNATIONAL CONFEDERATION OF MIDWIVES (ICM) SHALL:

- Advise and assist the Association of Malawian Midwives (AMAMI) to establish and utilise a monitoring, evaluation, and learning (MEL) framework for the project, including systematic ongoing data collection and analysis.
- Undertake an end of project evaluation.
- Build capacity of AMAMI in relation to MEL.

8. THE ASSOCIATION OF MALAWIAN MIDWIVES (AMAMI) SHALL:

- Implement the training activities in the Lilongwe and Mzimba districts at the facilities and in the nursing-midwifery schools according to the training plan.
- Support and monitor skills maintenance by visiting the facilities.
- Buy and distribute equipment and materials.
- Enter data and submit progress and financial reports.
- Establish and utilise a monitoring, evaluation and learning process with support from ICM and make quarterly reports to ICM.
- Provide data and other information as required to ICM for their conduct of the end of project evaluation.
- Liaise with Ministry of Health where required.

9. LAERDAL GLOBAL HEALTH SHALL:

- Provide programmatic support including initiation of remote facilitation.
- Donate ~~MamaBirthe~~ manikins as part of the LGH Buy One Gift One (BOGO) programme (shipping expenses not included)
- Guide in additional procurement based on the need of the project.

Valutakursen for Malawisk Kwacha justert med 44 % - 8. november 2023

Org. Budsjettet
83 722 000,00 Kwacha
81 600,00 USD

Da det bare revidere
budsjetet fra bunn
av og bruke USD.

Revidert Budsjettet
83 722 000,00 Kwacha
59 710,00 USD
21 890,00 USD
Buffert

81 600,00 USD

1 United States Dollar equals

1,684.50 Malawian
Kwacha

Dec 1, 03:29 UTC · Disclaimer

United States Dollar

Malawian Kwacha

More about USD/MWK →

Feedback



HOME > MWK / USD · CURRENCY

Malawian Kwacha to United States Dollar

0.00058 ↓ 56.70% -0.00076 5 Y

10 Sept, 11:19:18 UTC · Disclaimer

1D 5D 1M 6M YTD 1Y 5Y MAX



10.000 Happy Birthdays by Rotarty, Global Grant prosjekt



Dear Rotary members:

15 Jan.2024

Congratulations! Your global grant application for funding to train 1000 Malawian midwives in newborn resuscitation and management of labor and birth in Lilongwe and Mzimba, Malawi, submitted by the Rotary Club of Bwaila-Lilongwe and District 2250, has been approved by The Rotary Foundation. The award is in the amount of US\$ 81,600.00.

Prosjektet var endelig godkjent og prosjekt arbeidet kunne starte

Planene igangsatt

Kick-off møte avholdt 22 januar

- Budsjett ble revidert
- Prosjekt planer og Fremdriftsplaner ble revidert
- Ble enige å ha månedlige møter.
- Sterkt engasjert Team
- Krav fra RI ingen oppstart før penger var overført
- D2250 måtte overføre penger til Rotary Foundation og Rotary Distriktet i Malawi måtte også overføre sin minimums andel til Rotary Foundation,
- Noe som tok noe tid før det skjedde.

[illegible][illegible]

Nye utfordringer !

Trenings materiell ble allerede i Januar bestilt fra Kina og Containeren med trenings materiell og MamaBirthie simulatorer skulle sendes med båt til Mozambique og med landtransport til Lilongwe, Malawi.

- Trenings materiell, måtte forhånds betales før shipping..
- 5 April ble betaling bekreftet
- Nå kunne shipping av trenings materiell og MamaBirthie simulatorer iverksettes.
- Shipping ble utsatt flere ganger i perioden fra Januar.
- Dette pga situasjonen i frakt markedet er ustabilt etter Covid og situasjonen i Rødehavet gjør det ikke bedre.



Oppstart av Remote training



I midten av juli startet «remote» trening av 5 master trenere som lærte opp 33 trenere som igjen skulle trene jordmødre på sykehus og jordmor studenter. Opplæringen foregikk på nett med deltakere plassert sammen på to steder hvor prosjektet gjennomføres.



Alt treningsutstyr som nå er kommet til Malawi, distribueres nå til distriktene og jordmorskolene for å lære opp jordmødre i stor skala. Prosjektledere og ansatte fra AMAMI leder all opplæring, som er veldig motiverte og med mål om å utdanne inntil 1000 jordmødre.

Status ved utgangen av Mars 2025

- Siste trening ble avholdt 11 mars på **Daeyang University**
- Etter at siste treningsøkt avsluttet har vi trent **1.103** jordmødre og studenter.




• I GG søknaden satte vi som mål å trene 1.000 jordmødre,

GLOBAL GRANT 2348182				
10,000 HAPPY BIRTHDAYS- EXPENDITURE SUMMARY AS AT 31 MARCH 2025				
Item No.	Description	Approved Budget (USD)	Expenditure (USD)	Variances (USD)
1	Training of Midwives	52 300,00	41245,21	11 054,79
2	Monitoring/Evaluation	7 797,00	5704,36	2 092,64
3	Personnel	17 739,00	19085,45	-1 346,45
4	Publicity	663,00	0	663,00
5	Supplies	1 170,00	8483,41	-7 313,41
6	Project Management	1 744,00	2115,89	-371,89
7	Signage	187,00	0	187,00
	TOTAL	81 600,00	76 634,32	4 965,68



Fornøyde jordmødre og studenter på trening

AMAMI utarbeidet 4 kvartals rapporter i prosjekt perioden

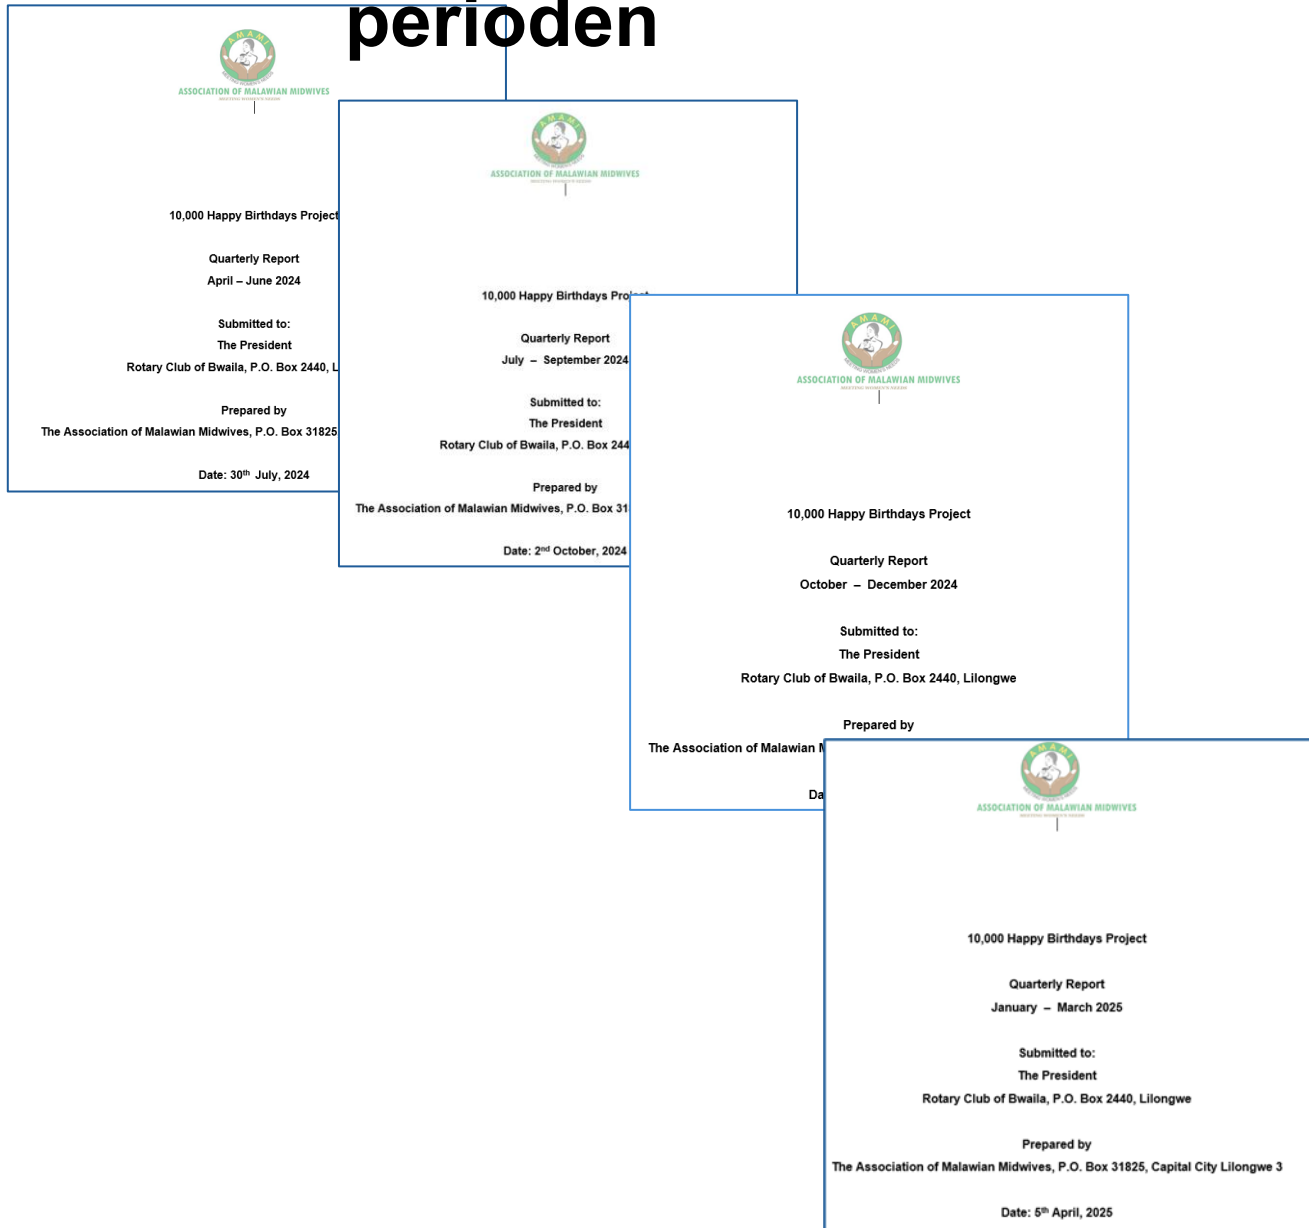

Mathias Chatuluka fra AMAMI (lokale jordmor forbundet) har vært en stor ressurs for oss gjennom hele prosjektet.

10.000 Happy Birthdays by Rotary, Global Grant prosjekt



Suksess Faktorer

- ✓ Starte prosjektet med i Malawi og bli kjent med alle involverte partnere
- ✓ Hadde månedlige Teams møter med alle i prosjektet hvor møtereferat ble skrevet samt aksjonspunkter og ansvarlig
- ✓ Stram prosjekt og budsjett oppfølging samt at bank kto skulle være i USD
- ✓ Sterkt fokus på at midlene skulle brukes på trening
- ✓ Gode samarbeids partnere

Budsjett oppfølging ved slutføring av prosjektet



Oppdatering 19.09.2025

GLOBAL GRANT 2348182							
10,000 HAPPY BIRTHDAYS- END OF PROJECT EXPENDITURE SUMMARY							
Item No.	Description	UNITED STATES DOLLAR				MALAWI KWACHA	
		Approved Budget (USD)	Expenditure (USD)	Variances (USD)		Budget (MWK)	Expenditure (MWK)
1	Training of Midwives	52,300.00	41,546.13	10,753.87		53,660,000.00	73,281,713.56
2	Monitoring/Evaluation	7,797.00	5,704.36	2,092.64		8,000,000.00	2,967,283.99
3	Personnel	17,739.00	20,984.04	-3,245.04		18,200,000.00	36,078,114.84
4	Publicity	663.00	0.00	663.00		680,000.00	0.00
5	Supplies	1,170.00	8,483.41	-7,313.41		1,200,000.00	423,772.50
6	Project Management	1,744.00	3,989.57	-2,245.57		1,789,344.00	6,451,388.72
7	Signage	187.00	227.51	-40.51		192,000.00	396,100.00
	TOTAL	81,600.00	80,935.00	665.00		83,721,344.00	119,598,373.61



Avsluttende refleksjoner fra Bwaila RC

10 000 bursdagsprosjekter står som et viktig og livreddende initiativ i Malawis helselandskap for mødre og nyfødte. At et utvalg på bare fire steder og 199 trente jordmødre resulterte i over 11 000 trygge fødsler, er et sterkt bevis på programmets virkelige innvirkning. De overveldende positive tilbakemeldingene fra studenter, forelesere, sykehusadministratorer og partnere understreker både behovet for og appetitten på vedvarende engasjement. Med strategiske investeringer, politisk støtte og fortsatt samarbeid har prosjektet potensial til å transformere mødre- og nyfødtsorgen over hele landet – og mangedoble disse bursdagene i årene som kommer.

